

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 29年 3 月

計画の名称	公園利用者の利便性を高める公園整備の推進		
計画の期間	公園利用者の利便性を高める公園整備の推進	交付対象	安芸市
計画の目標			

安芸市の西八幡公園の既存施設（野球場等）の拡張・改築を行い、野球場の利用者の増及び利便性を高めることで、公園利用者の利用促進、健康増進・憩いの場の創出を図ります。

計画の成果目標（定量的指標）

- ・西八幡公園の年間利用者数を26,500人（H23末）から28,000人（H28末）に増加。

定量的指標の定義及び算定式

	定量的指標の現況値及び目標値					備考				
	当初現況値 (H23末)	中間目標値	最終目標値 (H28末)							
西八幡公園の利用者数	26,500人	—	28,000人							
全体事業費	合計 (A+B+C)	747百万	A	746百万	B	0百万	C	1百万	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.1%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価の実施時期
—	中間評価：—、事後評価：平成29年3月
	公表の方法
	安芸市ホームページ

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	実績事業費 (百万円)	個別施設 計画 策定状況	備考
									H24	H25	H26	H27	H28				
1-A-1	公園	一般	安芸市	直接	安芸市	都市公園等事業（西八幡公園）	野球場改築（1.8ha）	安芸市						746	111	—	
合計													746	111			

B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	実績事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28			
合計													0			

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	実績事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28			
1-C-1	公園	一般	安芸市	直接	安芸市	西八幡公園施設整備事業	公園施設案内板の設置	安芸市						1	0	
合計													1	0		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
1-C-1	(1-A-1関係) 西八幡公園の都市公園事業と一体となり施設案内板を設置することにより、利用者の利便性の向上を図る。	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況	園路幅や周辺整備等により、利用者の安全性の向上が図られた。			
II 定量的指標の達成状況	指標①公園利用者数	最終目標値	28,000人	目標値と実績値に差が出た要因 各大会等との日程調整のため、計画期間内では、野球場の周辺整備工事のみを実施したため。
		最終実績値	27,274人	
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況	—			


3. 特記事項（今後の方針等）

定量的指標に関連する残事業については、平成29年度～平成32年度を計画期間とする「総合防災拠点機能を高める公園整備の推進（防災・安全）」により、事業を継続実施していく。

(参考資料)

計画の名称	公園利用者の利便性を高める公園整備の推進	交付対象	安芸市
計画の期間	平成24年度 ～ 平成28年度 (5年間)		

1-A-1 都市公園等事業(西八幡公園)

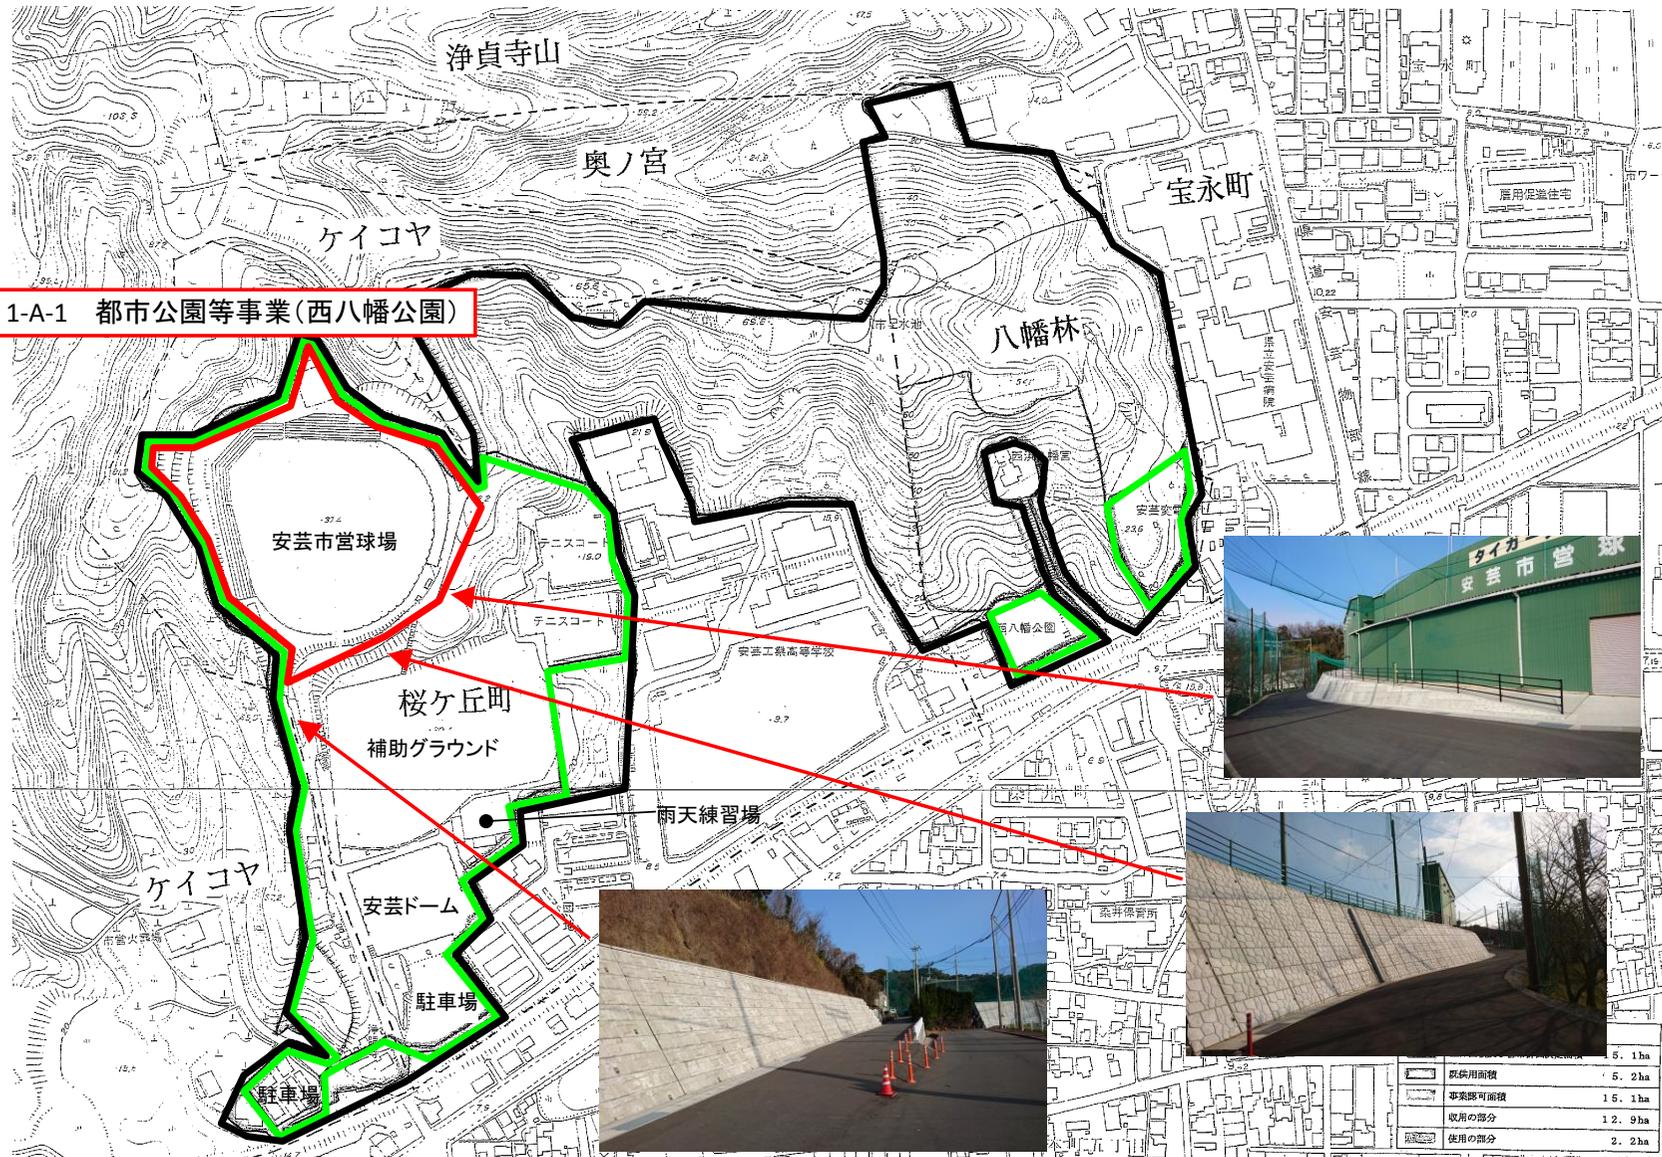

既設用面積	5.2ha
事業部可能積	15.1ha
収用の部分	12.9ha
使用の部分	2.2ha
